




- Phase 1
- Abbruch Fahrzeughalle D
 - Abbruch Nebengebäude
 - Neubau Fahrzeughalle D mit Dienstwohnungen und Tiefgarage

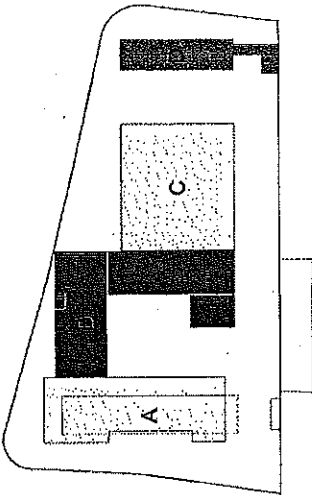


- Phase 2
- Zwischennutzung Dienstwohnungen als Sozialräume Werkstatt
 - Abbruch Werkstattgebäude B1 und B2
 - Abbruch Leiterhalle
 - Neubau Werkstattgebäude B mit Schlauchturnm
 - Neubau Fahrzeughalle B

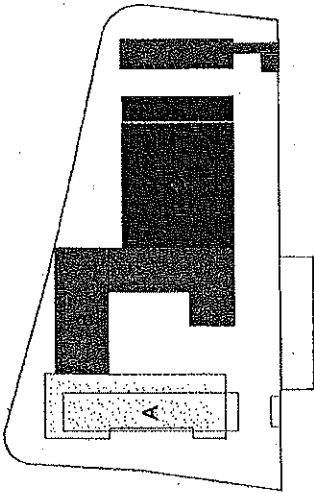

- Phase 3
- Umzug Werkstattpersonal in neue Sozialräume
 - Umbau Werkstattgebäude C in 2 Bauabschnitten
 - Anbau Carport

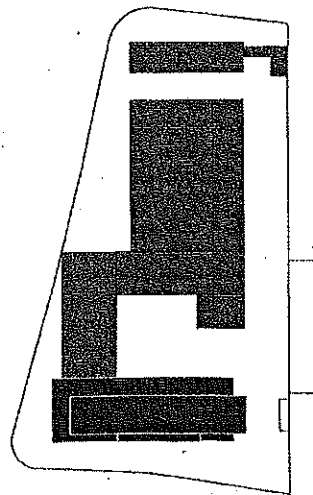

- Phase 4
- Inbetriebnahme Werkstatt
 - Auszug Feuerwehr in Interimsloge Gebäude D
 - Auslagerung Sonderfahrzeuge in Feuerwache 5
 - Umzug Kleiderkammer in Feuerwache 5
 - Sanierung Gebäude A in einem Bauabschnitt
 - Erweiterung Fahrzeughalle A zur Heidestr. hin

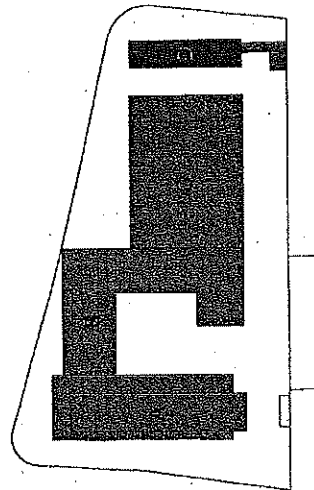

- Phase 5
- Auszug Interimsloge aus Bauteil D
 - Herstellen der Dienstwohnungen im Bauteil D
